MONTANA
A Tata Steel Enterprise

PLAN DE PERFORATION POUR HOLORIB®

N° conf. commande				**Client**									**Date**		
Liste		**Page**		**Objet**									**Responsable**		
				Lieu									**Délai**		
Type de profil				**Revêtement** ☐ zinguée ☐ DU 15my ☐ Polyester 25my											
Epaisseur du matériau				**Couleur**											
				Distance en perforation en mm											
Pos.	**Pces.**	**Long.**	**BVA***	Demiperf. gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Demiperf. droite
		0													
		0													
		0													
		0													
		0													
		0													
		0													
		0													

Indications pour les perforations: Distances entre les perforations min. 550 mm (excepté pour les perforations en double rangées). Dans le cas de perforations en double rangées, la distance après celles-ci doit être au min. 550 mm. Voir exemple ci-dessous!

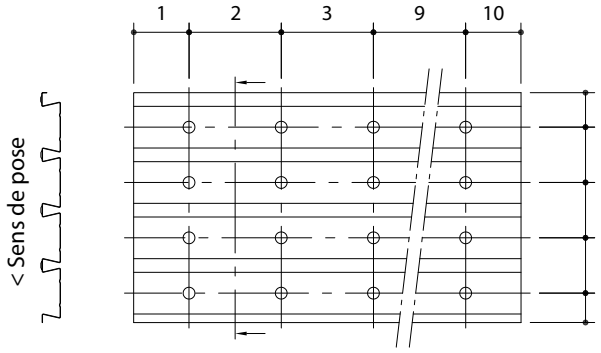

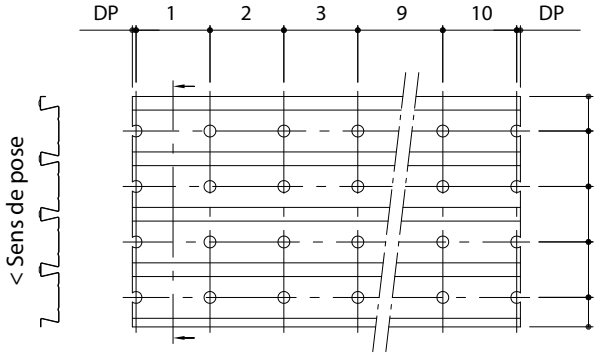

Exemple sans demi-perforation:
Mesure 1 = variable (min. 30 mm)
Mesure 2 = min. 80 mm (perforations en double rangées) / max. 550 mm
Mesure 3 = min. 550 mm
Mesure 4 = min. 80 mm (perforations en double rangées) / max. 550 mm
Mesure 5 = min. 550 mm
etc.
Mesure restante

Exemple avec demi-perforation (DP):
DP gauche = ✓
Mesure 1 = min. 80 mm (perforations en double rangées) / max. 550 mm
Mesure 2 = min. 550 mm
Mesure 3 = min. 80 mm (perforations en double rangées) / max. 550 mm
Mesure 4 = min. 550 mm
Mesure 5 = min. 800 mm
etc.
DP droite = ✓

Remarques / Indications:
- Longueur des tôles min. 2000 mm
- Distance entres les perforations min. 550 mm (excepté au début des demi- perforations) Tolérances de longueurs +/- 5 mm
- Diamètre des perforations 50 mm (à l'axe de l'aile du profil HR 51)
- Possible uniquement avec 4 perforations par rangée
- Les distances entre les perforations sont à inscrire dans le tableau
- Distance minimale 80 mm (pour perforations en double rangées sur porteur)
- Les demi-perforations à chaque extrémité sont à une distance de 1 mm de celle-ci
- La longueur de la tôle est la somme de toutes les distances entre les perforations (la mesure 1mm pour les demi-perforations n'est pas prise en compte)
- Les profilés revêtus sont livrés avec des bandes de film de protection

***Ancrages BVA:** (longueur des tôles min. 2000 mm)
Ce sont des écrasements des nervures aux extrémités des tôles c.àd. la fermeture des 3 nervures du milieu (la nervure de recouvrement reste ouverte, pour la pose)



Description sur le formulaire / saisie de commande
Voir tableau BVA*
BVA = écrasement des nervures aux 2 extrémites
BVA/R = écrasement des nervures à l'extrémité droite
BVA/L = écrasement des nervures à l'extrémité gauche

Sous réserve de modification

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen
Tel. + 41 56 619 85 85

Montana Systèmes
de Construction SA
CH-1028 Préverenges
Tel. + 41 21 801 92 92

Montana Bausysteme AG
Zweigniederlassung
D-86845 Grossaitingen
Tel. + 49 8203 95 90 555

www.montana-ag.ch
info@montana-ag.ch
